


Tagesaktuelle
Arbeitsfortschritte

Sprint Burndown Chart:

Darstellung, die tagesaktuell den Arbeitsfortschritt des Sprints aufzeigt. Zeigt auch den geschätzte Aufwand für den Restwert auf. Neben den entsprechenden Kurven macht es Sinn, auch den Erledigungsgrad pro Tag grafisch festzuhalten.

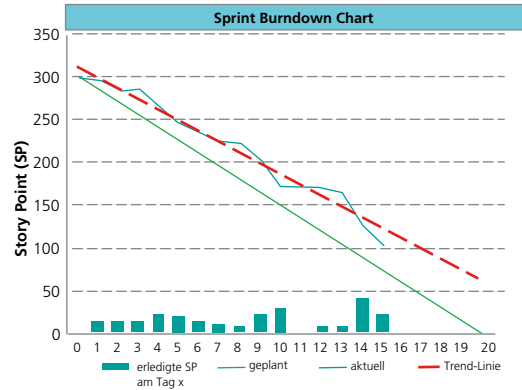

Kanban Board/Taskboard:

Einfaches und übersichtliches Planungs-, Status- und Open-Task-Tool. Ideal ist, wenn das Entwicklungsteam das Board stets aktuell hält und im Daily Scrum Meeting bespricht. Dabei werden die User Stories in priorisierter Reihenfolge aufgeführt.



Auf einem einzelnen Post-it-Zettel wird ein einzelner Task aufgeführt (Task kann innerhalb eines Tagesaufwandes bearbeitet werden). Die Teammitarbeiter wählen selbstständig aufgrund ihrer Skills einen Zettel respektive eine Task (Status: Task geplant) und notieren darauf ihren Namen und nehmen diesen somit „in Arbeit“.

Impediment Backlog:

eine Auflistung aller Hindernisse, denen das Sprint Team begegnet. Es wird in der Retrospektive und ggf. im Daily Scrum Meeting ergänzt. Mit gezielten Aktionen versucht der Scrum Master, diese Hindernisse während des Sprints aus dem Weg zu räumen. Das Impediment Backlog hat nicht zum Ziel, eine „Buchhaltung“ über die Abarbeitung der Hindernisse zu führen. Normalerweise werden die Impediments jedes Mal in der Retrospektive frisch aufgenommen und priorisiert. Was nicht mehr aufgebracht wird, hat sich erledigt – egal weshalb.

Eigner	Problem	Workaround	Lösung	Zieldatum	Status
Huber	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	14.08.20nn	Erledigt
Meier	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	13.10.20nn	In Arbeit
Müller	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	Stagespezifische Aufgaben sind nicht lösbar	10.09.20nn	Offen
